CÔNG TY TNHH TM DV XD TÂM NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 290925

HCM, Ngày 29 Tháng 09 Năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TRA KỸ THUẬT

Công trình: Cao ốc Văn Phòng.

Địa chỉ: 94C Đường Cao Thắng, P. 3, Q.3, TPHCM

I. Hệ thống kiểm tra:

1) Tổ máy chạy tầng G,M,1.

Dữ liệu Dàn Lạnh: Phát hiện hư đầu dò cảm biến nhiệt độ các dàn lạnh ID:03,ID04, ID06, ID07,ID09. Kiểm tra lại ID01, ID02 không kết nối hệ thống

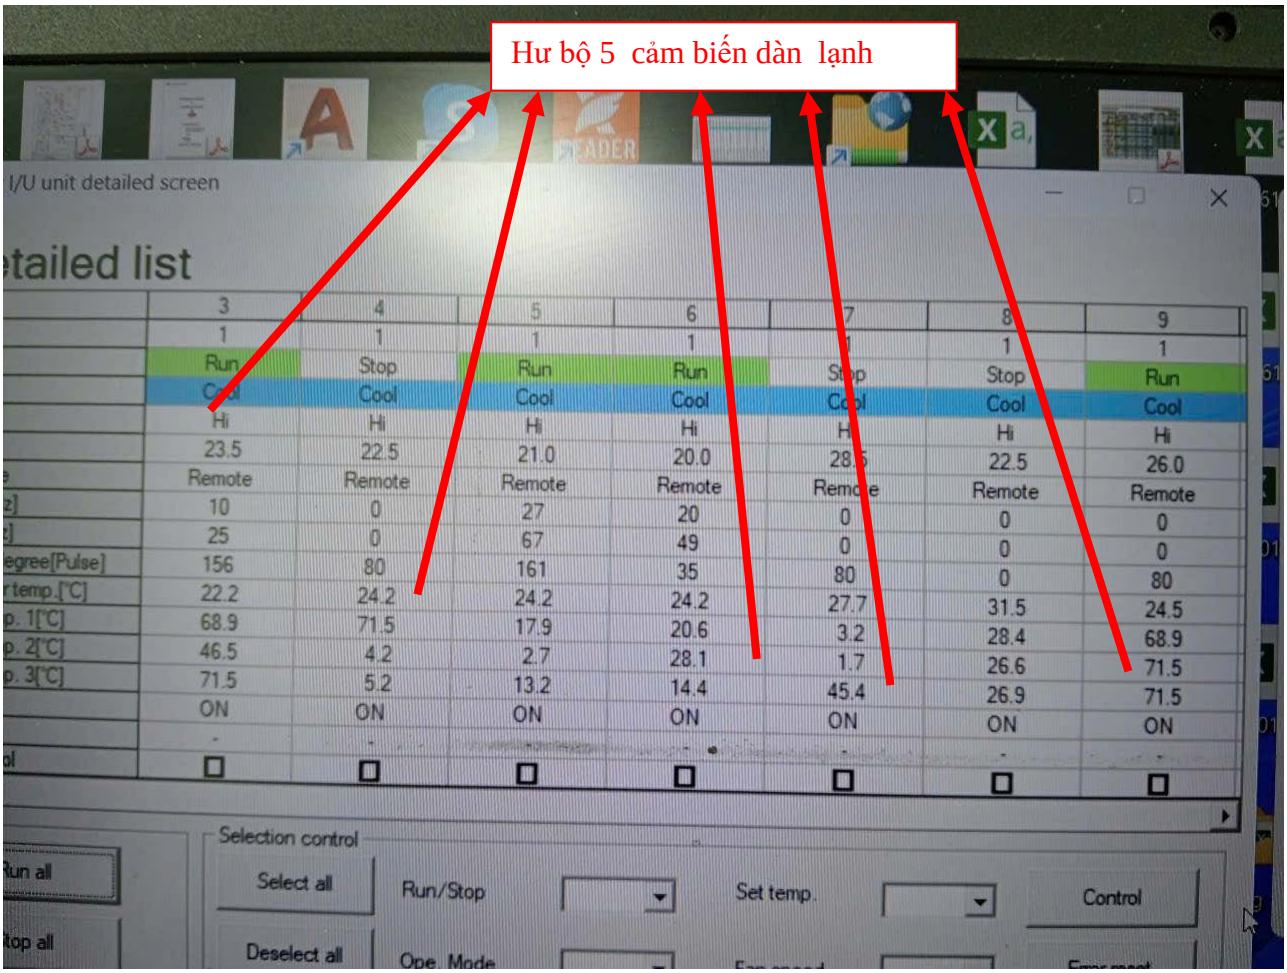

Dữ liệu dàn nóng: Chưa phát hiện hư hỏng kiểm tra lại dây tín hiệu AB kết nối kém.

SL Checker O/U detailed screen

O/U detailed list

O/U address	1
Inverter Hz 1[Hz]	92
Discharge pipe temp. 1[℃]	69.1
Under-dome temp. 1[℃]	36.1
Comp. 1 amps[A]	11.0
Inverter Hz 2[Hz]	92
Discharge pipe temp. 2[℃]	63.6
Under-dome temp. 2[℃]	34.0
Comp. 2 amps[A]	11.5
Discharge pipe temp. 3[℃]	-
Under-dome temp. 3[℃]	-
Comp. 3 amps[A]	-
Heat exch. temp. 1[℃]	42.0
Heat exch. temp. 2[℃]	42.6
Heat exch. temp. 3[℃]	59.3
Heat exch. temp. 4[℃]	60.5
High pressure[MPa]	2.47
Low pressure[MPa]	0.75
Outdoor air temp.[℃]	36.6

2) **Tổ máy chạy tầng 2; 3; 4.**

Dữ liệu Dàn Lạnh: Phát hiện hư đầu dò cảm biến nhiệt độ các dàn lạnh ID:03, ID06, ID07,ID08,ID10, ID14.

Phát hiện hư boar nguồn dàn lạnh ID:04 và ID13, ID05, ID12

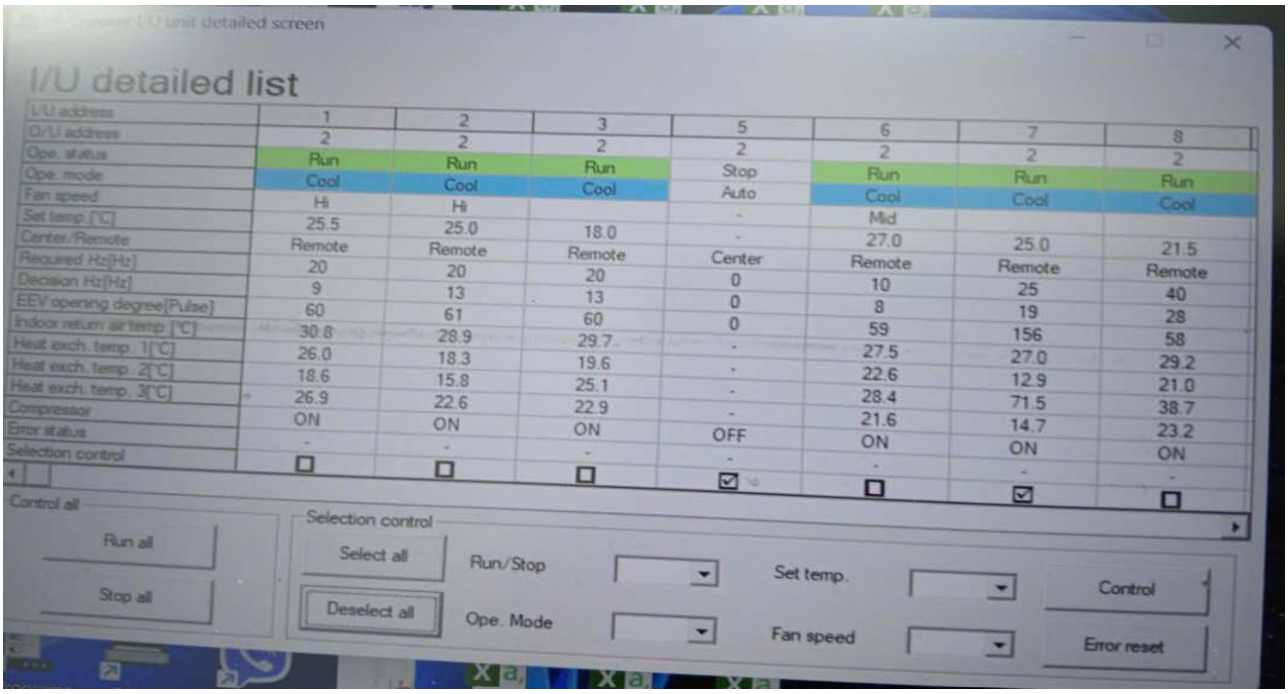

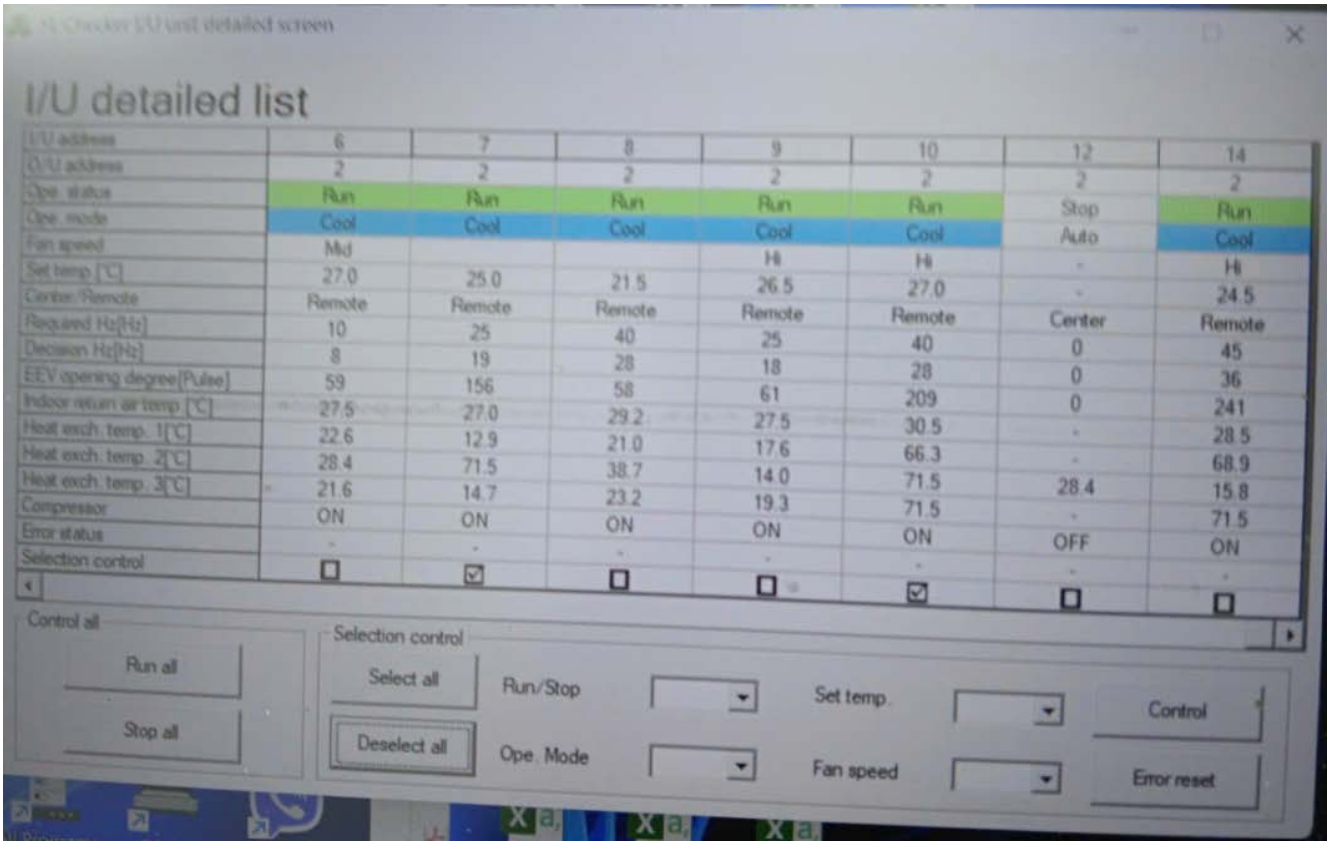

I/U detailed list

I/U address	6	7	8	9	10	12	14
O/U address	2	2	2	2	2	2	2
Ope. status	Run	Run	Run	Run	Run	Stop	Run
Ope. mode	Cool	Cool	Cool	Cool	Cool	Auto	Cool
Fan speed	Mid			Hi	Hi	-	Hi
Set temp.[°C]	27.0	25.0	21.5	26.5	27.0	-	24.5
Center/Remote	Remote	Remote	Remote	Remote	Remote	Center	Remote
Required Hz[Hz]	10	25	40	25	40	0	45
Decision Hz[Hz]	8	19	28	18	28	0	36
EEV opening degree[Pulse]	59	156	58	61	209	0	241
Indoor return air temp.[°C]	27.5	27.0	29.2	27.5	30.5	-	28.5
Heat exch. temp. 1[°C]	22.6	12.9	21.0	17.6	66.3	-	68.9
Heat exch. temp. 2[°C]	28.4	71.5	38.7	14.0	71.5	28.4	15.8
Heat exch. temp. 3[°C]	21.6	14.7	23.2	19.3	71.5	-	71.5
Compressor	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
Error status	-	-	-	-	-	-	-
Selection control	☐	☑	☐	☐	☑	☐	☐

Control all: Run all, Stop all

Selection control: Select all, Deselect all, Run/Stop, Ope. Mode, Set temp., Fan speed, Control, Error reset

Dữ liệu dàn nóng: Phát hiện hệ thống nạp dư gas cho hệ thống và tín hiệu kết nối A-B kém kiểm tra lại dây điện kết nối.

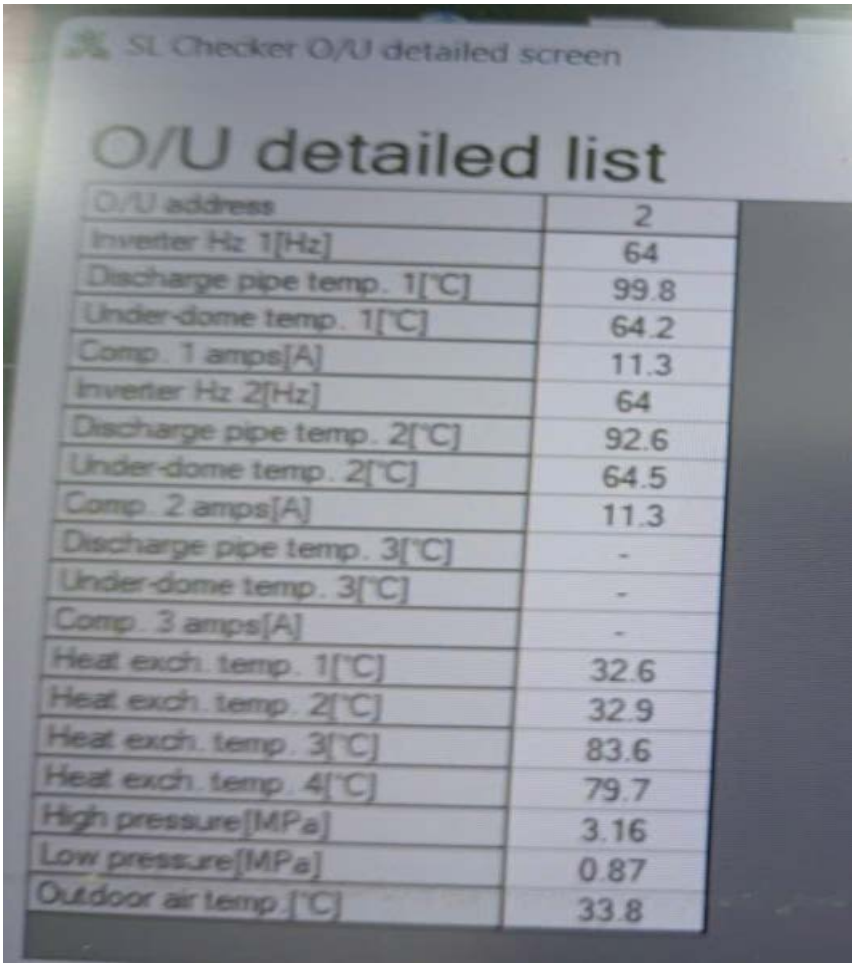

SL Checker O/U detailed screen

O/U detailed list

O/U address	2
Inverter Hz 1[Hz]	64
Discharge pipe temp. 1[°C]	99.8
Under-dome temp. 1[°C]	64.2
Comp. 1 amps[A]	11.3
Inverter Hz 2[Hz]	64
Discharge pipe temp. 2[°C]	92.6
Under-dome temp. 2[°C]	64.5
Comp. 2 amps[A]	11.3
Discharge pipe temp. 3[°C]	-
Under-dome temp. 3[°C]	-
Comp. 3 amps[A]	-
Heat exch. temp. 1[°C]	32.6
Heat exch. temp. 2[°C]	32.9
Heat exch. temp. 3[°C]	83.6
Heat exch. temp. 4[°C]	79.7
High pressure[MPa]	3.16
Low pressure[MPa]	0.87
Outdoor air temp.[°C]	33.8

3) **Tổ máy chạy tầng 5; 6; 7.**

Dữ liệu Dàn Lạnh: Phát hiện hư đầu dò cảm biến nhiệt độ các dàn lạnh ID:03 Phát hiện hư boar nguồn dàn lạnh ID04, kiểm tra lại các dàn lạnh ID12,ID14 không có bỏa mạch dàn lạnh.ID09, ID10 boar nguồn chập chờn lúc chạy lúc không.

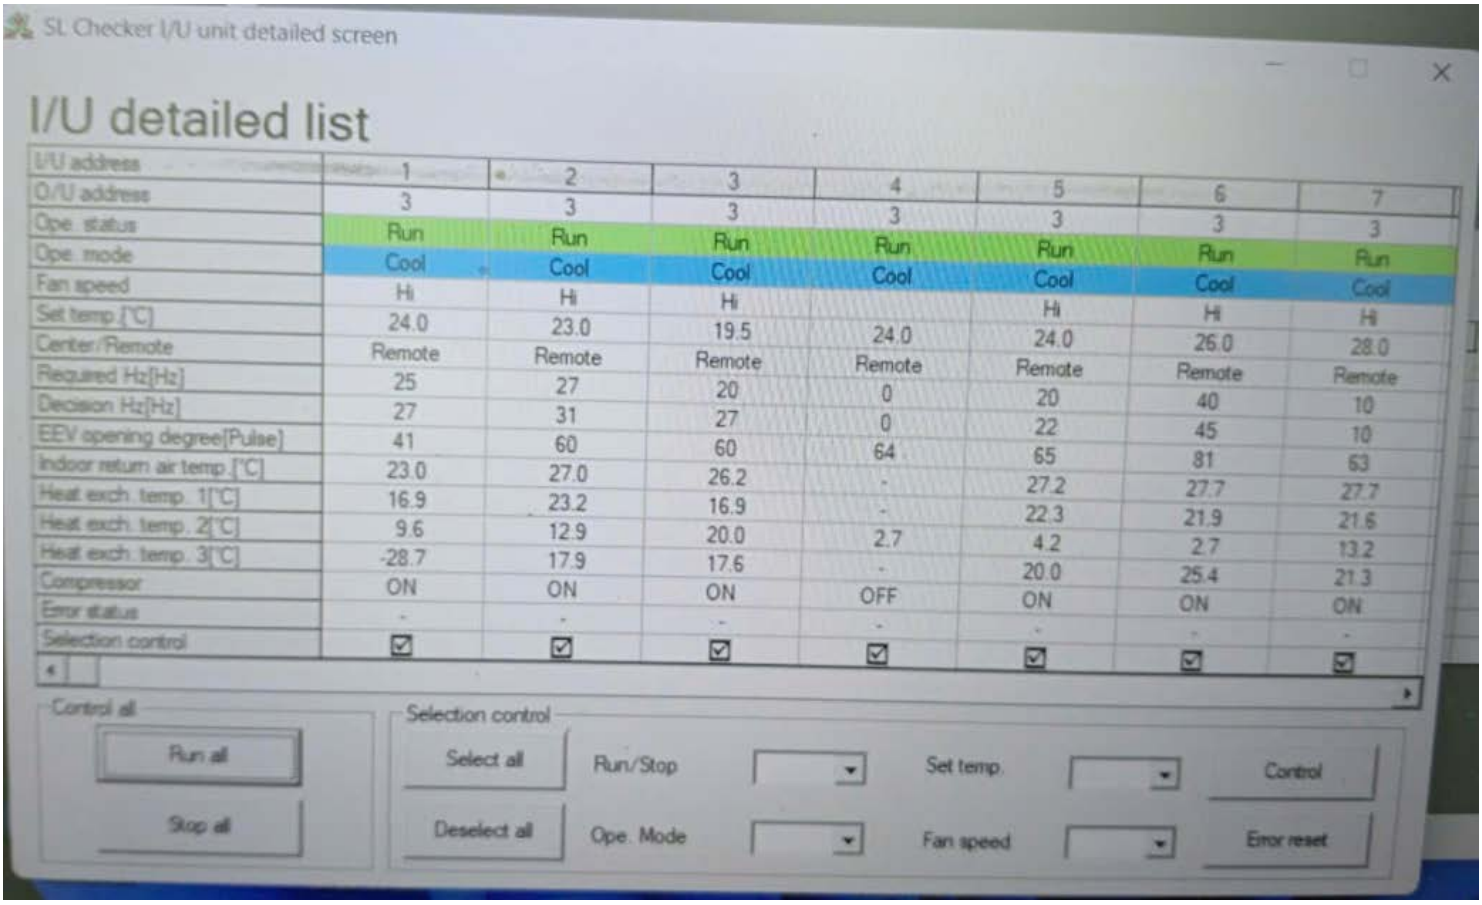

I/U address	1	2	3	4	5	6	7
O/U address	3	3	3	3	3	3	3
Ope. status	Run	Run	Run	Run	Run	Run	Run
Ope. mode	Cool	Cool	Cool	Cool	Cool	Cool	Cool
Fan speed	Hi	Hi	Hi		Hi	Hi	Hi
Set temp.[°C]	24.0	23.0	19.5	24.0	24.0	26.0	28.0
Center/Remote	Remote	Remote	Remote	Remote	Remote	Remote	Remote
Required Hz[Hz]	25	27	20	0	20	40	10
Decision Hz[Hz]	27	31	27	0	22	45	10
EEV opening degree[Pulse]	41	60	60	64	65	81	63
Indoor return air temp.[°C]	23.0	27.0	26.2	-	27.2	27.7	27.7
Heat exch. temp. 1[°C]	16.9	23.2	16.9	-	22.3	21.9	21.6
Heat exch. temp. 2[°C]	9.6	12.9	20.0	2.7	4.2	2.7	13.2
Heat exch. temp. 3[°C]	-28.7	17.9	17.6	-	20.0	25.4	21.3
Compressor	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
Error status	-	-	-	-	-	-	-
Selection control	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

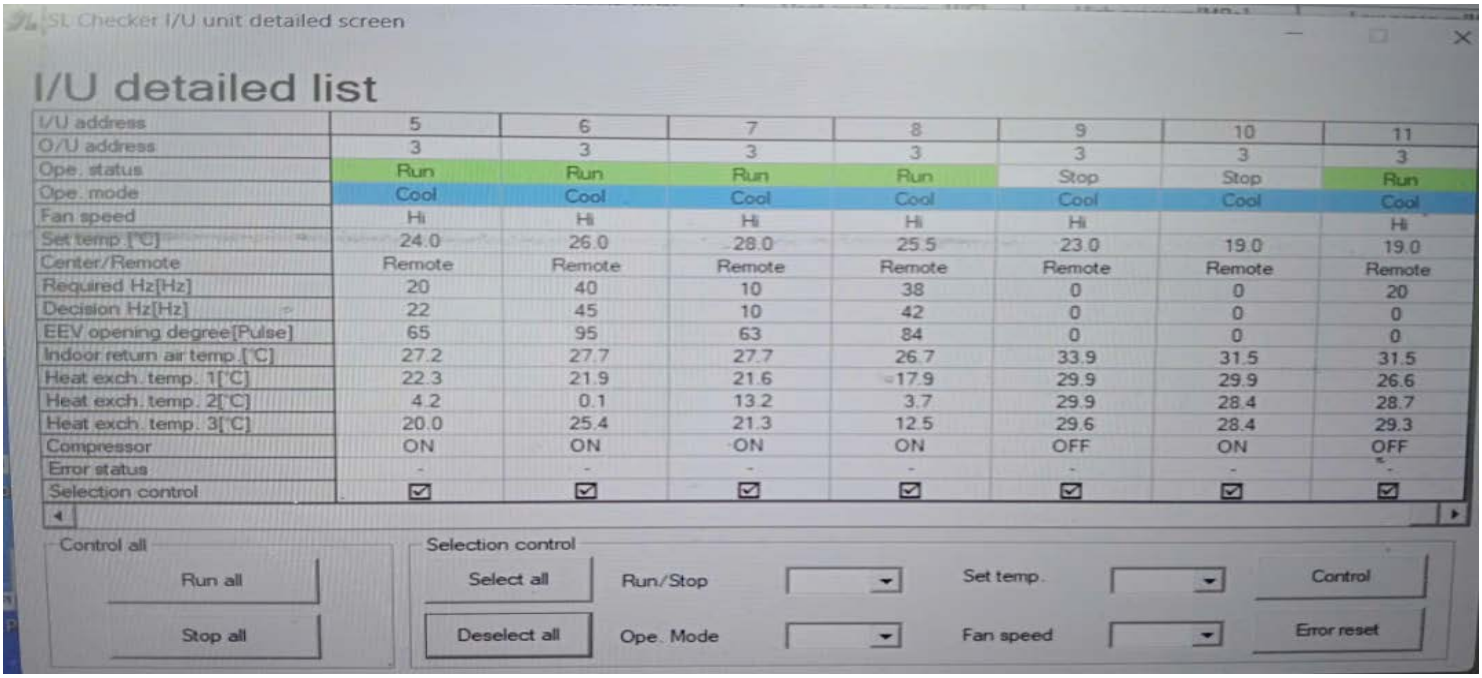

I/U address	5	6	7	8	9	10	11
O/U address	3	3	3	3	3	3	3
Ope. status	Run	Run	Run	Run	Stop	Stop	Run
Ope. mode	Cool	Cool	Cool	Cool	Cool	Cool	Cool
Fan speed	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi		Hi
Set temp.[°C]	24.0	26.0	28.0	25.5	23.0	19.0	19.0
Center/Remote	Remote	Remote	Remote	Remote	Remote	Remote	Remote
Required Hz[Hz]	20	40	10	38	0	0	20
Decision Hz[Hz]	22	45	10	42	0	0	0
EEV opening degree[Pulse]	65	95	63	84	0	0	0
Indoor return air temp.[°C]	27.2	27.7	27.7	26.7	33.9	31.5	31.5
Heat exch. temp. 1[°C]	22.3	21.9	21.6	17.9	29.9	29.9	26.6
Heat exch. temp. 2[°C]	4.2	0.1	13.2	3.7	29.9	28.4	28.7
Heat exch. temp. 3[°C]	20.0	25.4	21.3	12.5	29.6	28.4	29.3
Compressor	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
Error status	-	-	-	-	-	-	-
Selection control	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

Dữ liệu dàn nóng: Chưa phát hiện hư hỏng kiểm tra lại dây tín hiệu AB kết nối giữa dàn lạnh và dàn nóng.

SL Checker O/U detailed screen

O/U detailed list

O/U address	3
Inverter Hz 1[Hz]	120
Discharge pipe temp. 1[℃]	99.4
Under-dome temp. 1[℃]	59.7
Comp. 1 amps[A]	15.9
Inverter Hz 2[Hz]	120
Discharge pipe temp. 2[℃]	100.2
Under-dome temp. 2[℃]	60.3
Comp. 2 amps[A]	16.2
Discharge pipe temp. 3[℃]	-
Under-dome temp. 3[℃]	-
Comp. 3 amps[A]	-
Heat exch. temp. 1[℃]	46.3
Heat exch. temp. 2[℃]	46.6
Heat exch. temp. 3[℃]	86.1
Heat exch. temp. 4[℃]	86.1
High pressure[MPa]	2.75
Low pressure[MPa]	0.71
Outdoor air temp.[℃]	34.9

II. Tiến hành kiểm tra hệ thống ghi nhận:

- Hư 6 boar nguồn dàn lạnh
- Hư 12 Bộ cảm biến nhiệt độ trên đường ống gas dàn lạnh
- Cân chỉnh lại gas hệ thống máy lạnh tầng 2 ;3 ;4 và kiểm tra lại dây tín hiệu A-B của các tổ dàn nóng.

III. Nguyên nhân:

- Do hệ thống hoạt động lâu ngày dẫn đến thiết bị sẽ oxi hóa theo thời gian nên cảm biến nhiệt độ không ổn định.
- Tín hiệu Dây khiển AB của tổ dàn nóng bị nhiễu tín hiệu do dây bị chuột cắn dây hoặc bị trốc lớp cách điện của dây AB nên bị nhiễu.

IV. Kết luận:

Đề nghị ban quản lý tòa nhà có kế hoạch cho sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng trên để hệ thống hoạt động được bình thường trở lại.

CÔNG TY TNHH DV XD TÂM NGUYÊN
(Ký, họ tên)
